

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567


จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาล้งงาน สาขaprะปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ กรอบวงเงินรวมตามมติ ครม. จำนวน 2,032,606.19 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 1,035,771.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.96 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จำนวน 80,734.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.85 ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 102.51 ของแผนการเบิกจ่ายเงินสะสม 8 เดือน (78,756.14 ล้านบาท)

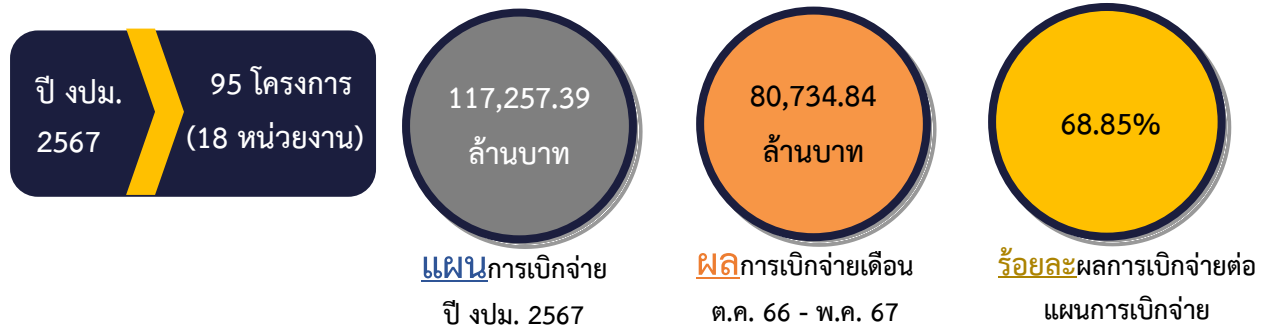

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน

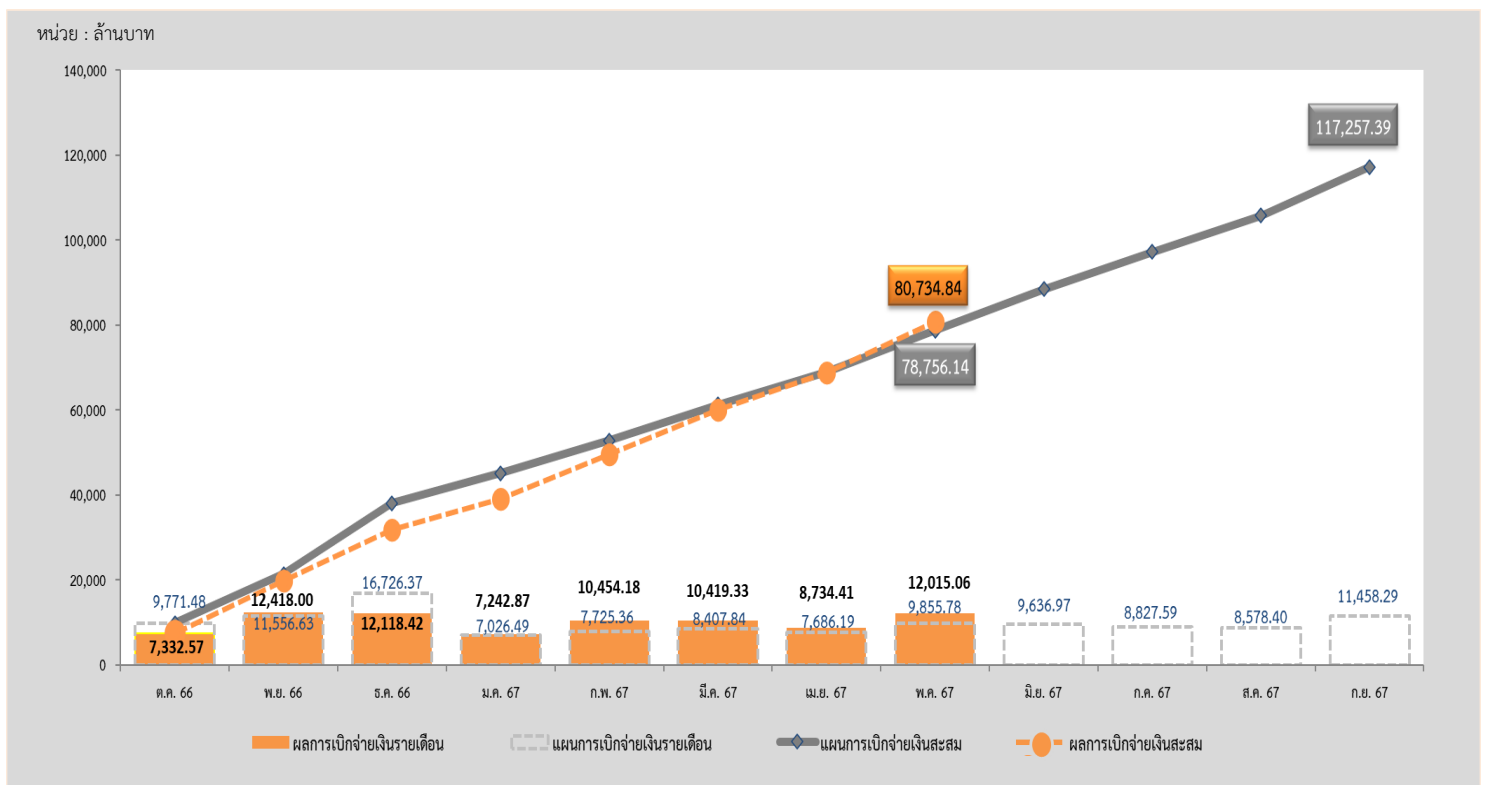

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งเงิน


ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 80,734.84 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้สะสม จำนวน 43,666.89 ล้านบาท (ร้อยละ 54.09) เงินรายได้สะสม จำนวน 25,380.40 ล้านบาท (ร้อยละ 31.44) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 11,687.55 ล้านบาท (ร้อยละ 14.47) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงินพบว่า

- **เงินกู้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 43,666.89 ล้านบาท (ร้อยละ 49.37 ของแผน)

- **เงินรายได้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,380.40 ล้านบาท (ร้อยละ 124.88 ของแผน)


- **เงินงบประมาณ** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 11,687.55 ล้านบาท (ร้อยละ 137.63 ของแผน)

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

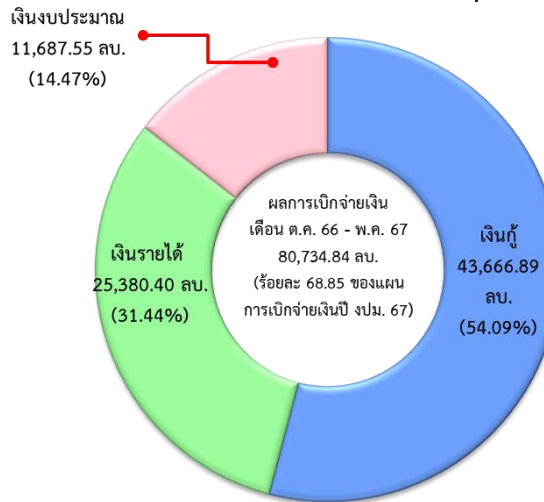

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

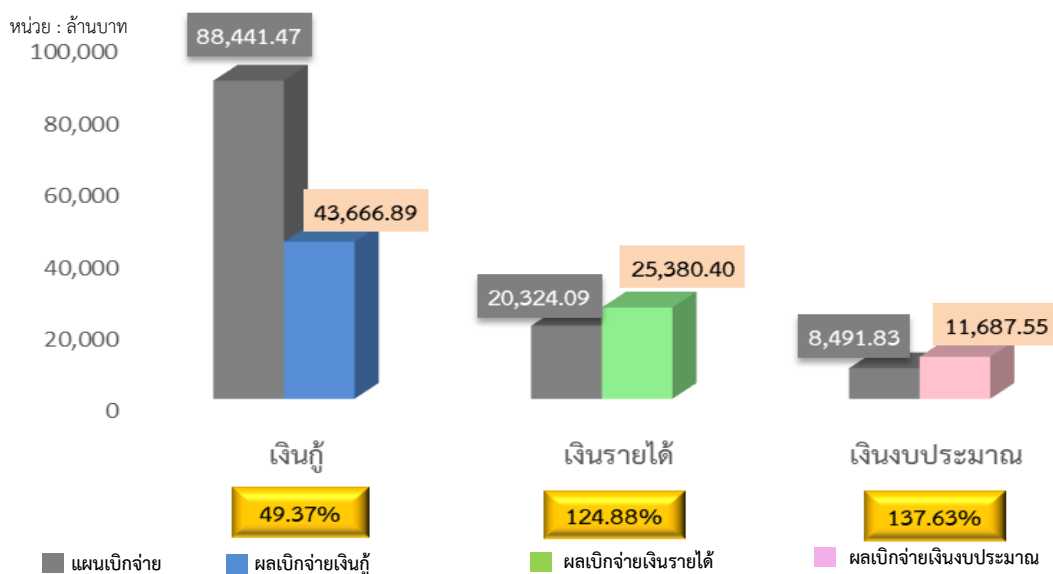

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามสาขาการลงทุน

เมื่อพิจารณาแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามสาขาการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพบว่า สาขาการลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. สาขาคมนาคมขนส่ง แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

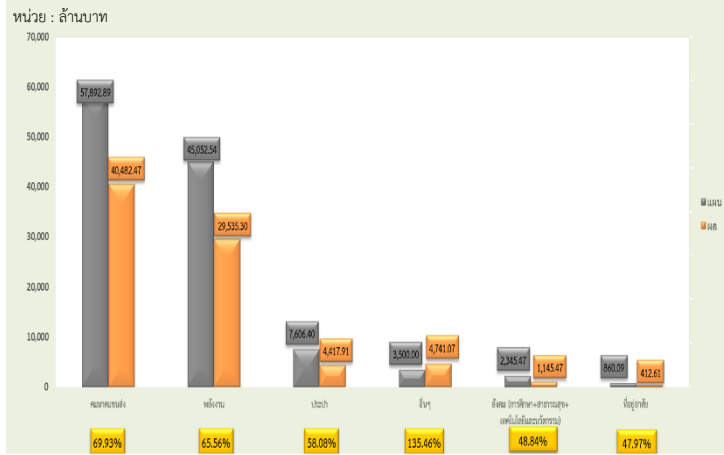

มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 57,892.89 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 40,482.47 ล้านบาท (ร้อยละ 69.93 ของแผน) 2. สาขาพลังงาน มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 45,052.54 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 29,535.30 ล้านบาท (ร้อยละ 65.56 ของแผน) และ 3. สาขาประปา มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 7,606.40 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 4,417.91 ล้านบาท (ร้อยละ 58.08 ของแผน)


ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

แผนภาพที่ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

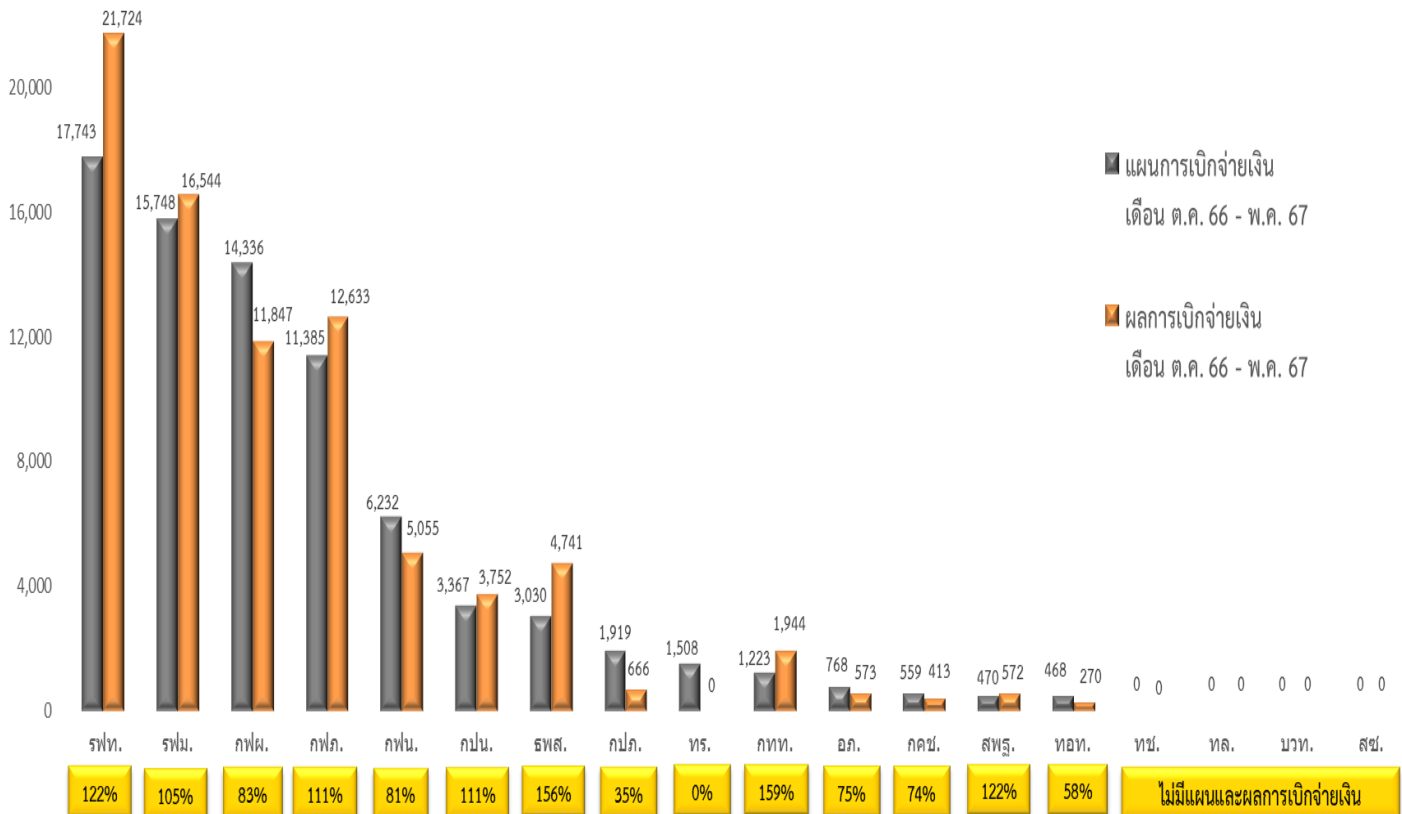

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้**สูงกว่า**แผนการเบิกจ่าย 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน**ต่ำกว่า**แผนการเบิกจ่าย และ 3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 721.15 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 1,944.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 159 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กทท. เร่งรัดงานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล และงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2567 นอกจากนี้ ผู้รับจ้างคาดว่าจะในเดือนพฤศจิกายน 2567 จะนำเข้าเรือชุดลำที่ 3 ซึ่งจะครบทั้งหมด 3 ลำ ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และจะใช้ถมทะเลร่วมกับเรือชุดที่นำเข้ามาแล้วในพื้นที่ท่าเรือ E1 E2 และ F2 ภายหลังจากงานถมทะเลพื้นที่ท่าเรือ F1 แล้วเสร็จต่อไป

2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 1,711.07 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 4,741.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 156 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี ธพส. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารด้านทิศใต้ และงานตกแต่งภายในอาคาร เพื่อให้สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ได้ตามแผน ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน ทั้งนี้ ธพส. ได้ส่งมอบพื้นที่ให้สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 5 เป็นหน่วยงานแรกแล้ว และจะทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานตามแผนต่อไป โดยคาดว่าจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2568

3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 3,981.41 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 21,723.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ของ รฟท. เร่งรัดการเวนคืนที่ดิน และส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างทางรถไฟ และสถานีรถไฟได้เร็วกว่าแผน

4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 102.43 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 572.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค สพฐ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการงบบุคลากรของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง และเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันไทย - Kosen

5) การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 384.36 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 3,751.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 กปน. เร่งรัดการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม และช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมด

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 1,248.27 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 12,633.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) กฟภ. เร่งรัดการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานก่อสร้างสถานีควบคุมไฟฟ้า และปรับปรุงสถานีที่เสื่อมสภาพ

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

7) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เบิกจ่ายสูงกว่าแผน 795.90 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 16,544.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 105 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) รฟม. เร่งรัดการดำเนินโครงการ โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 33.82 เร็วกว่าแผนร้อยละ 9.56 โดยสัญญาที่ 1 สัญญาก่อสร้างงานโยธา งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่ง และสถานีใต้ดิน ช่วงเตาปูน - หอสมุดแห่งชาติ มีความก้าวหน้าร้อยละ 45.38 เร็วกว่าแผนร้อยละ 14.73 และสัญญาที่ 2 สัญญาก่อสร้างงานโยธา งานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความก้าวหน้าร้อยละ 40.08 เร็วกว่าแผนร้อยละ 19.03

8) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 194.84 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 573.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้งและทดสอบงานระบบผลิตน้ำ ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของแต่ละอาคาร จึงยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบสนับสนุนและเบิกจ่ายเงินได้ รวมทั้งการส่งมอบงานเครื่องจักร ในกระบวนการผลิตเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเส้นทางขนส่งทางเรือทำให้ต้องใช้ระยะเวลา ในการขนส่งเพิ่มขึ้น และ อภ. มีการแก้ไขสัญญางานเครื่องจักรให้ตรงกับสภาพการใช้งานจริงที่เปลี่ยนแปลง ตามเทคโนโลยีการผลิตก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทำให้เบิกจ่ายเงินไม่ได้ตามแผน โดยคณะทำงานติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการได้ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด ซึ่ง อภ. คาดว่าจะสามารถติดตั้ง เครื่องจักรได้ภายในเดือนกันยายน 2567

9) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 146.46 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 412.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การก่อสร้าง อาคาร A1 กคช. ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้รับจ้าง รายใหม่ ทั้งนี้ กคช. ได้ผู้ชนะการเสนอราคาเพื่อก่อสร้างโครงการ และคณะกรรมการ กคช. เห็นชอบการประกาศผล ผู้ชนะการเสนอราคาแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน 2567

10) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 197.70 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 270.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ทอท. เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ทอท. ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง รายเดิมแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถจัดหาวัสดุ และแรงงานเข้ามาดำเนินการได้ โดย ทอท. อยู่ระหว่างประมาณค่าเสียหาย และราคาค่าก่อสร้างใหม่สำหรับ ส่วนงานที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิม เพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ และ 2) งานซื้อ พร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่าง ทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วน เป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนและระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบ สายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอ ต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง

11) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,252.97 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 666.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่-สงขลา อ.หาดใหญ่-เมืองสงขลา จ.สงขลา งานวางท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจาก งานส่วนที่ 1 กปภ. อยู่ระหว่างพิจารณา ข้อเสนอของผู้ยื่นคำขอเสนอขายที่ดินตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่ดิน โดยคาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ ในเดือนกรกฎาคม 2567 และจัดซื้อที่ดินได้ในเดือนกันยายน 2567 งานส่วนที่ 2 กปภ. อยู่ระหว่างหารือกับ กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคา และจะเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ้างต่อไป โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ ในเดือนกันยายน 2567 และงานส่วนที่ 3 กปภ. อยู่ระหว่างพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาดว่าจะ จัดหาผู้รับจ้างและลงนามสัญญาได้ในเดือนสิงหาคม 2567

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2567

12) กองทัพเรือ (ทร.) **ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน** โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ในส่วนของรัฐรับภาระการลงทุน) ทร. ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเจรจาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) โดยคาดว่าจะเริ่มเจรจาเงินกู้ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2567 และลงนามสัญญาเงินกู้ในเดือนกันยายน 2567
