

# Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567


จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Project) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ ครอบคลุมวงเงินรวมตามมติ ครม. จำนวน 2,033,537.15 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 993,816.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.87 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

**แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน** โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 จำนวน 39,027.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.28 ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 86.57 ของแผนการเบิกจ่ายเงินสะสม 4 เดือน (45,080.97 ล้านบาท)

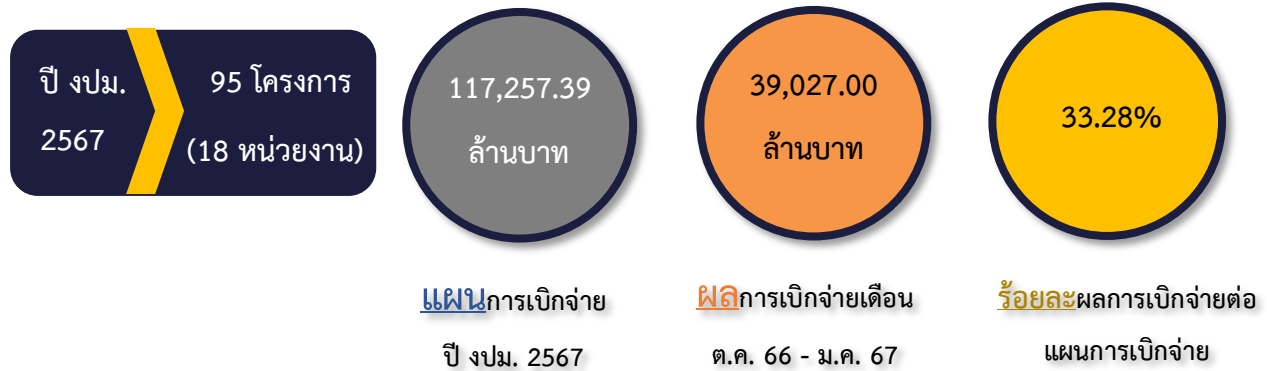

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน

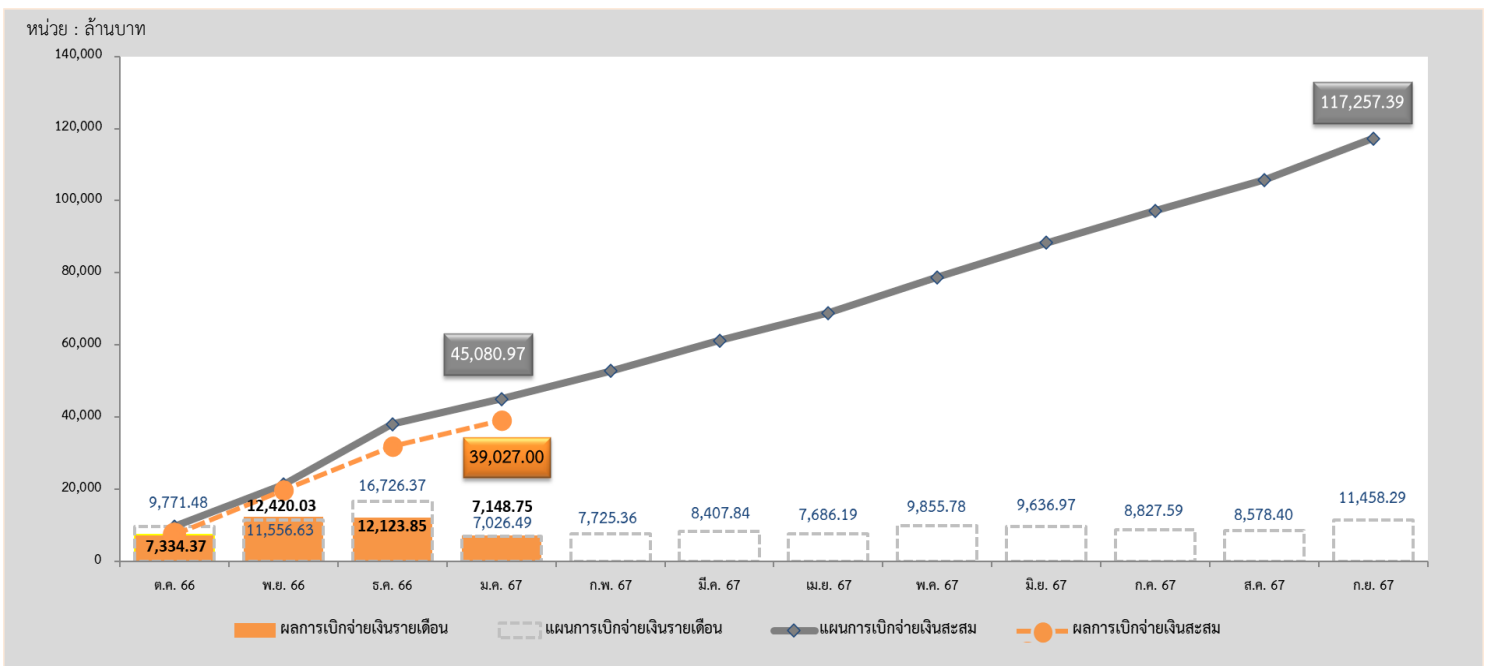

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567


แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งเงิน

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 39,027.00 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้สะสม จำนวน 15,627.92 ล้านบาท (ร้อยละ 40.04) เงินรายได้สะสม จำนวน 18,655.01 ล้านบาท (ร้อยละ 47.80) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 4,744.07 ล้านบาท (ร้อยละ 12.16) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามแหล่งเงินพบว่า


- **เงินกู้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 15,627.92 ล้านบาท (ร้อยละ 17.67 ของแผน)
- **เงินรายได้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 18,655.01 ล้านบาท (ร้อยละ 91.79 ของแผน)
- **เงินงบประมาณ** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 4,744.07 ล้านบาท (ร้อยละ 55.87 ของแผน)

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

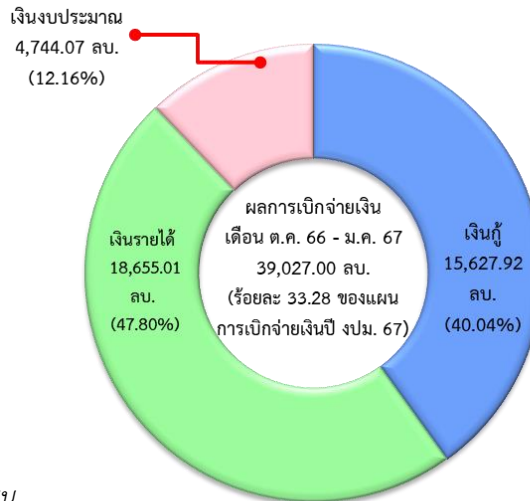

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบง.

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

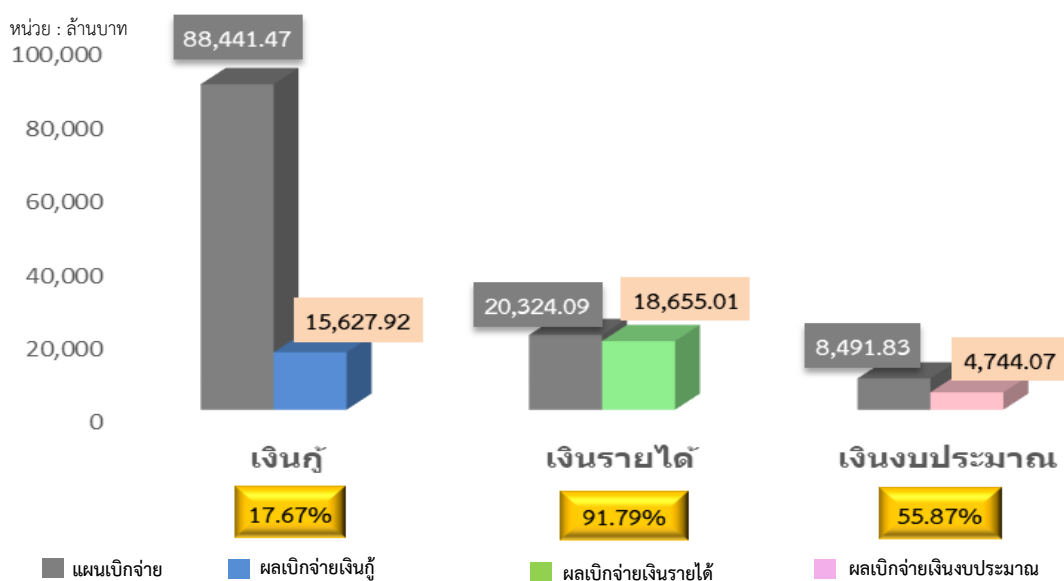

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบง.

# Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามสาขาการลงทุน

เมื่อพิจารณาแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามสาขาการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพบว่า สาขาการลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. สาขาคมนาคมขนส่ง แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

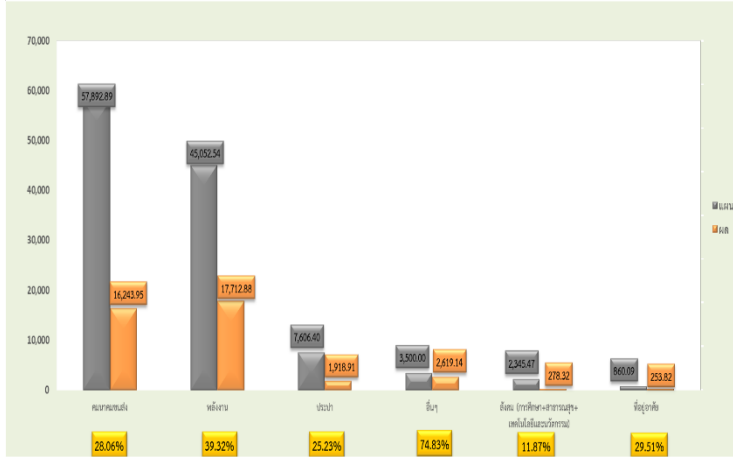

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบง.


มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 57,892.89 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 16,243.95 ล้านบาท (ร้อยละ 28.06 ของแผน) 2. สาขาพลังงาน มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 45,052.54 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 17,712.88 ล้านบาท (ร้อยละ 39.32 ของแผน) และ 3. สาขาประปา มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 7,606.40 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 1,918.91 ล้านบาท (ร้อยละ 25.23 ของแผน)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

แผนภาพที่ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

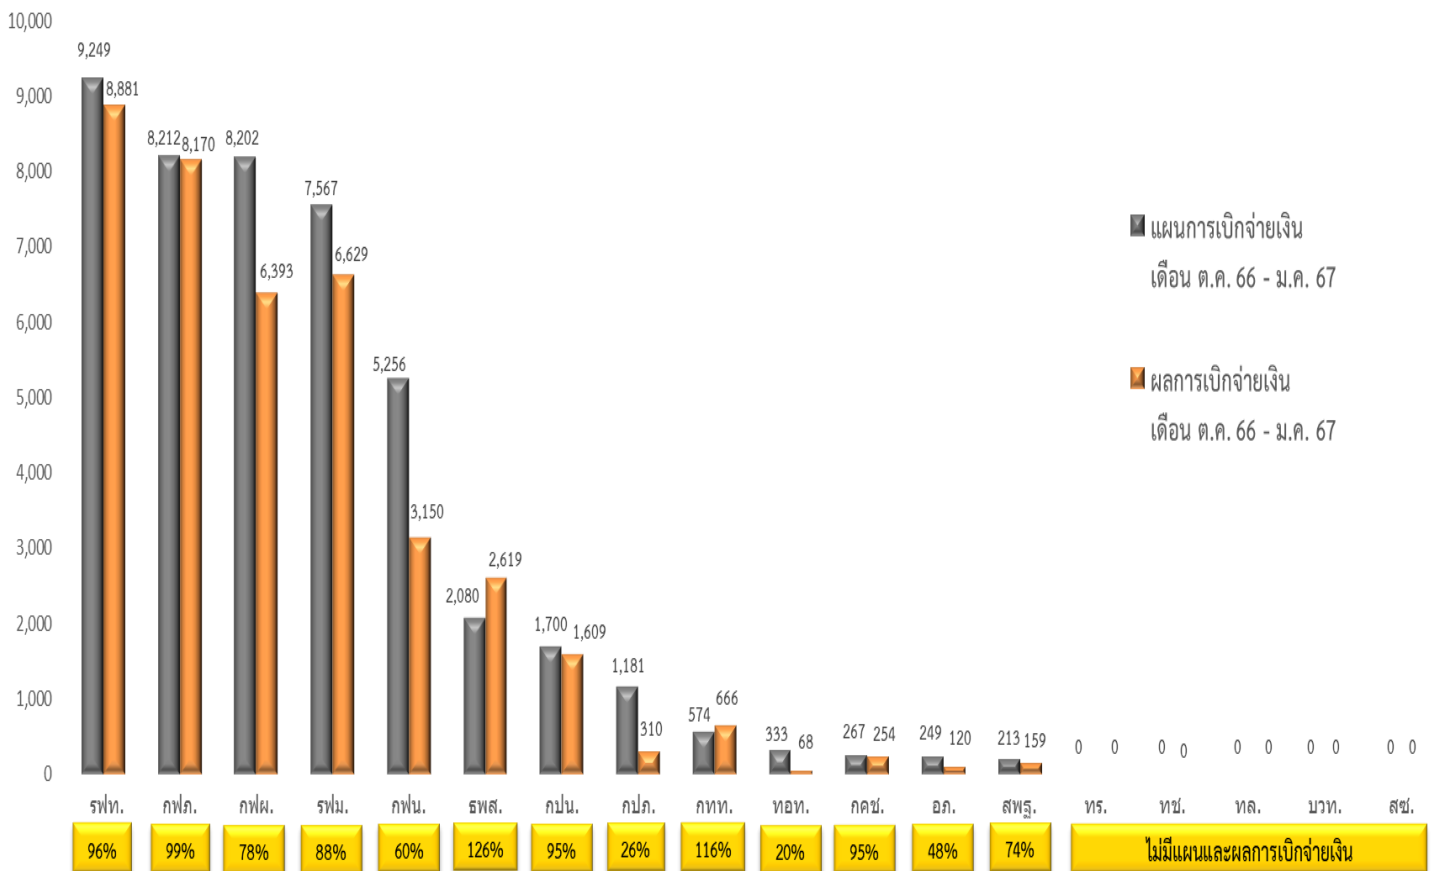

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบง.

# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้**สูงกว่า**แผนการเบิกจ่าย และ 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน**ต่ำกว่า**แผนการเบิกจ่าย โดยมียรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัท ธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 539.14 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 2,619.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 126 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี ธพส. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ อาคารด้านทิศใต้ และงานพัฒนาระบบโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน โดย ธพส. คาดว่าจะทยอยเปิดใช้งานโครงการและส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2568

2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 92.70 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 666.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กทท. เร่งรัดการก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล และงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างเร่งรัดการนำเข้าเรือขุดเพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 จากนั้นจะเร่งรัดงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ E1 E2 และ F2 ต่อไป

3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เบิกจ่าย**ต่ำกว่า**แผน 1,808.70 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 6,393.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า กฟผ. ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 kv ไทรน้อย – แจ่งวัฒนะได้ เนื่องจากมีการอุทธรณ์แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และคัดค้านการเข้าพื้นที่จากประชาชน ส่งผลให้ กฟผ. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าทดแทนกรรมสิทธิ์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวได้ ทั้งนี้ กฟผ. อยู่ระหว่างเร่งเจรจากับประชาชนพร้อมกับพิจารณาปรับแก้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงใหม่ในบางพื้นที่เพื่อให้เริ่มก่อสร้างได้โดยเร็ว รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงนครราชสีมา 4 ลำช้า เนื่องจาก กฟผ. ตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินแปลงที่เสนอขายให้ กฟผ. อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติทำให้ไม่สามารถจัดซื้อที่ดินดังกล่าวได้ โดย กฟผ. อยู่ระหว่างสำรวจที่ดินแห่งใหม่สำหรับการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน

4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่าย**ต่ำกว่า**แผน 54.74 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 158.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค สพฐ. และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้สำหรับเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาที่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้ตามแผน เนื่องจากนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 23 คน มีกำหนดตรวจสอบสภาพร่างกาย และสุขภาพจิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และ สป.อว. คาดว่าจะส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อได้ในเดือนมีนาคม 2567 และทยอยเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อเป็นทุนการศึกษาและเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นได้ในเดือนเมษายน 2567 ส่วนการก่อสร้างสถาบันไทย – Kosen แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สจล. ได้ลงนามสัญญากับผู้รับจ้างรายใหม่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 และเริ่มการก่อสร้างโครงการแล้ว โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 13.28 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 7.65 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมกราคม 2567

5) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 2,105.50 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 3,150.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของแผนการเบิกจ่าย) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) กฟน. ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (Street Light) ล่าช้า ประกอบกับยังไม่สามารถเข้าพื้นที่บางส่วนเพื่อก่อสร้างได้ จึงไม่สามารถรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าได้ รวมทั้ง กฟน. จะต้องก่อสร้างบ่อพักบนผิวจราจรเพิ่มเติม เนื่องจากบ่อพักเดิมติดกับท่อระบายน้ำ จึงไม่สามารถลากสายใต้ดินได้ ซึ่ง กฟน. จะเร่งประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ กฟน. มีส่วนงานที่ต้องดำเนินการร่วมกับงานก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวง (ทล.) ซึ่งต้องรอให้ ทล. ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน กฟน. จึงจะเริ่มลากสายใต้ดินได้

6) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 129.18 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 119.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง อัญมณี จ.ปทุมธานี อภ. ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามแผน เนื่องจากผู้รับจ้างส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินค่างานระบบสนับสนุนอาคาร และงานเครื่องจักร วงเงิน 129 ล้านบาทไม่ครบถ้วน รวมทั้ง อภ. มีการแก้ไขสัญญางานเครื่องจักรให้ตรงกับสภาพการใช้งานจริงก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดย อภ. คาดว่าจะเบิกจ่ายเงินค่างานระบบสนับสนุนอาคาร และงานเครื่องจักรได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

7) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 870.64 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 310.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาหาดใหญ่-สงขลา อ.หาดใหญ่-เมืองสงขลา จ.สงขลา งานส่วน 1 กปภ. อยู่ระหว่างพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นคำขอเสนอขายที่ดินตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่ดิน โดยคาดว่าจะจัดซื้อที่ดินได้ในเดือนกันยายน 2567 งานส่วน 2 กปภ. อยู่ระหว่างพิจารณาผลผู้ชนะการประกวดราคา และคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพื่ออนุมัติผลการประกวดราคา และลงนามสัญญาได้ภายในเดือนเมษายน 2567 งานส่วน 3 กปภ. จะจัดทำประชาพิจารณ์ในช่วงวันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 และจะประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 264.42 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 68.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของแผนการเบิกจ่าย) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ทอท. ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผนเนื่องจาก 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ทอท. ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถจัดหาวัสดุและแรงงานเข้ามาดำเนินการได้ โดย ทอท. อยู่ระหว่างประมาณค่าเสียหาย และราคาค่าก่อสร้างใหม่สำหรับส่วนงานที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิม เพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 2) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนและระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง 3) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (APM) และงานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาออก) ทอท. อยู่ระหว่างรอเอกสารเบิกจ่ายค่างานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง และ 4) งานจ้างก่อสร้างงานที่มีความจำเป็นเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อการใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างการแก้ไขเอกสารการขอเบิกจ่ายค่าจ้างงานจาก ทอท. ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
