

# Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567


จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ กรอบวงเงินรวมตามมติ ครม. จำนวน 2,032,606.19 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 1,042,309.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.28 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

**แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน** โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 จำนวน 87,273.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 98.73 ของแผนการเบิกจ่ายเงินสะสม 9 เดือน (88,393.12 ล้านบาท)

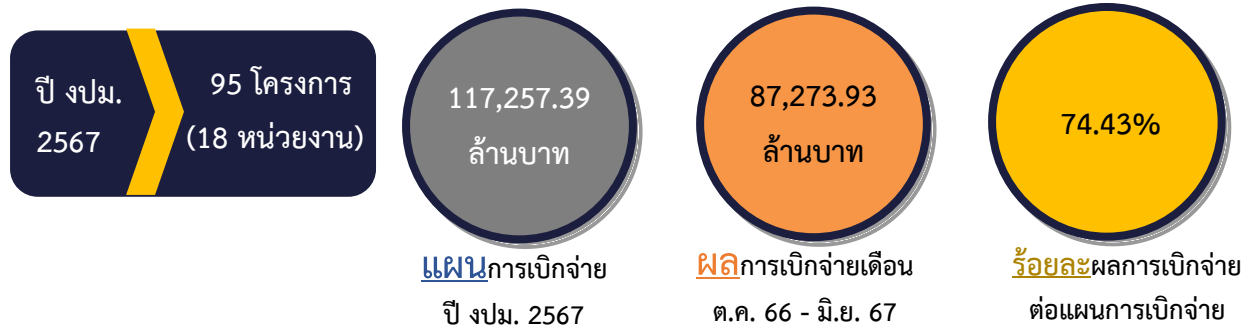

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน

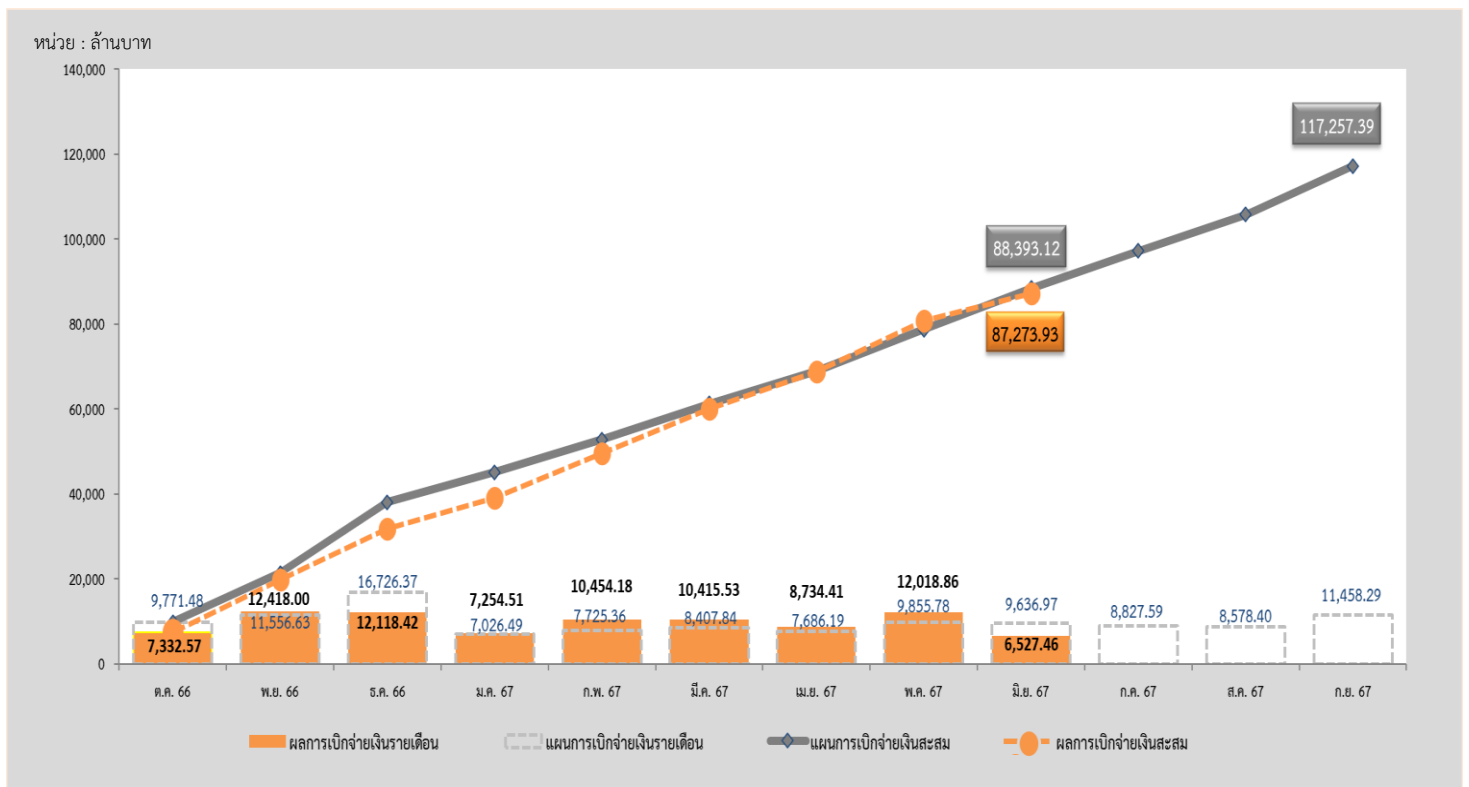

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งเงิน


ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 87,273.93 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้สะสม จำนวน 45,976.25 ล้านบาท (ร้อยละ 52.68) เงินรายได้สะสม จำนวน 28,869.56 ล้านบาท (ร้อยละ 33.08) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 12,428.12 ล้านบาท (ร้อยละ 14.24) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงินพบว่า

- **เงินกู้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 45,976.25 ล้านบาท (ร้อยละ 51.98 ของแผน)

- **เงินรายได้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 28,869.56 ล้านบาท (ร้อยละ 142.05 ของแผน)


- **เงินงบประมาณ** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 12,428.12 ล้านบาท (ร้อยละ 146.35 ของแผน)

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

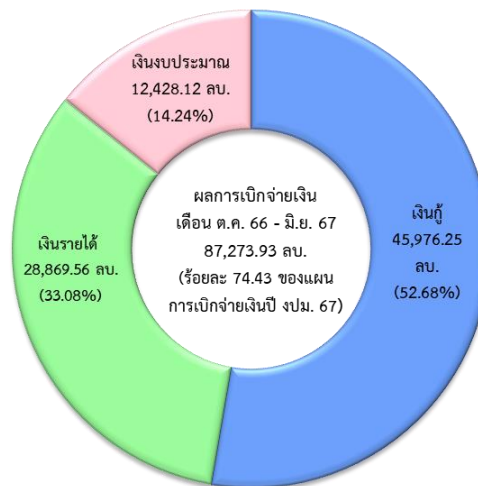

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

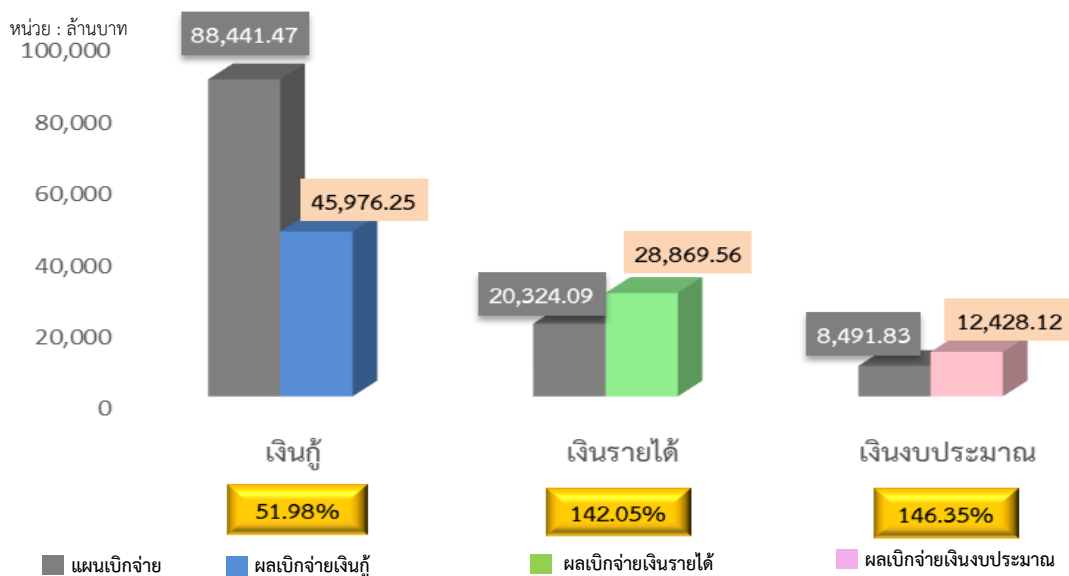

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.



# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้**สูงกว่า**แผนการเบิกจ่าย 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน**ต่ำกว่า**แผนการเบิกจ่าย และ 3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่าย** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 1,782.69 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 4,922.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 157 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี ธพส. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ และจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ได้ตามแผน ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้เข้าใช้พื้นที่โครงการเพื่อปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เป็นหน่วยงานแรกแล้ว และ ธพส. จะทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานตามแผนต่อไป โดยคาดว่าจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567

2) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 540.80 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 1,950.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 138 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กทท. เร่งรัดงานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล และงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2567 นอกจากนี้ ผู้รับจ้างคาดว่าจะในเดือนพฤศจิกายน 2567 จะนำเข้าเรือขุดลำที่ 3 ซึ่งจะครบทั้งหมด 3 ลำ ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และจะใช้ถมทะเลร่วมกับเรือขุดที่นำเข้ามาแล้วในพื้นที่ท่าเรือ E1 E2 และ F2 ภายหลังจากงานถมทะเลพื้นที่ท่าเรือ F1 แล้วเสร็จต่อไป

3) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 3,761.94 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 24,320.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 122 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ของ รฟท. เร่งรัดการเวนคืนที่ดิน และส่งมอบพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่แปลงต่อเนื่องให้แก่ผู้รับจ้าง ทำให้ผู้รับจ้างสามารถเข้าพื้นที่การก่อสร้างทางรถไฟและสถานีรถไฟได้เร็วกว่าแผน

4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 102.65 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 699.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ในประเทศและภูมิภาค สพฐ. เร่งรัดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันไทย – Kosen แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5) การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 599.43 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 4,319.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 116 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 กปน. เร่งรัดการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม และช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมด

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 892.57 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 13,657.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 107 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (คพจ.2) กฟภ. เร่งรัดการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า งานสายส่ง และงานระบบจำหน่ายเหนือดินและใต้ดินในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครหาดใหญ่ และเมืองพัทยา

# Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2567

7) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 174.92 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 470.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคาร A1 กคช. ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ทั้งนี้ กคช. ลงนามสัญญาก่อสร้างกับผู้รับจ้างรายใหม่แล้วเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และอยู่ระหว่างส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง

8) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 180.25 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 287.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 61 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 – 2560) ทอท. เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ทอท. อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายโครงการ และคำนวณราคาค่าก่อสร้างสำหรับส่วนงานที่เหลือของผู้รับจ้างรายเดิม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากนั้น ทอท. จะเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่และลงนามสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2568 2) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน ทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนและระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง

9) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,184.11 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 881.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ. สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อ.เมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ งานวางท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจาก กปภ. อยู่ระหว่างปรับแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างงานวางท่อของโรงสูบน้ำแรงสูงบริเวณหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยใหม่ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2567 และดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2568

10) กองทัพเรือ (ทร.) ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ในส่วนที่รัฐรับภาระการลงทุน) ทร. ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเจรจาเงินกู้กับธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย (AIIB) โดยคาดว่าจะเริ่มเจรจาเงินกู้ได้ภายในเดือนสิงหาคม 2567 และเริ่มเบิกจ่ายเงินกู้ในเดือนธันวาคม 2567
