

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567


จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาล้งงาน สาขaprะปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ กรอบวงเงินรวมตามมติ ครม. จำนวน 2,032,606.19 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 1,023,610.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.36 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 จำนวน 68,728.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.61 ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.75 ของแผนการเบิกจ่ายเงินสะสม 7 เดือน (68,900.36 ล้านบาท)

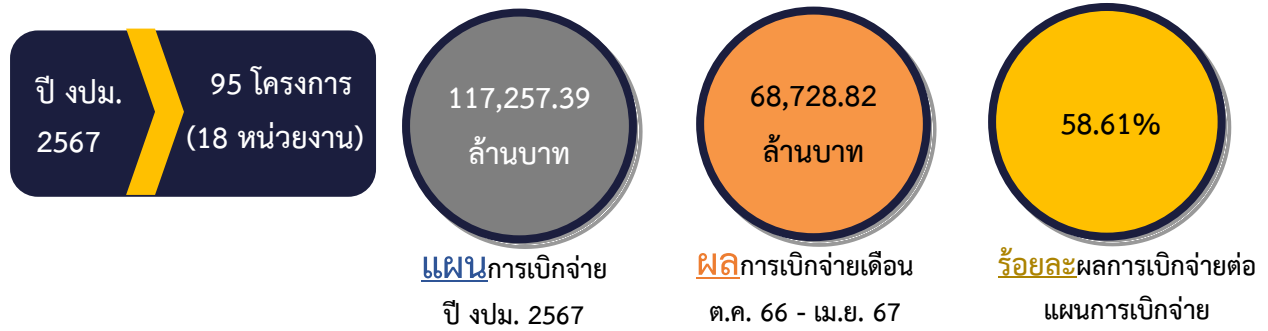

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน

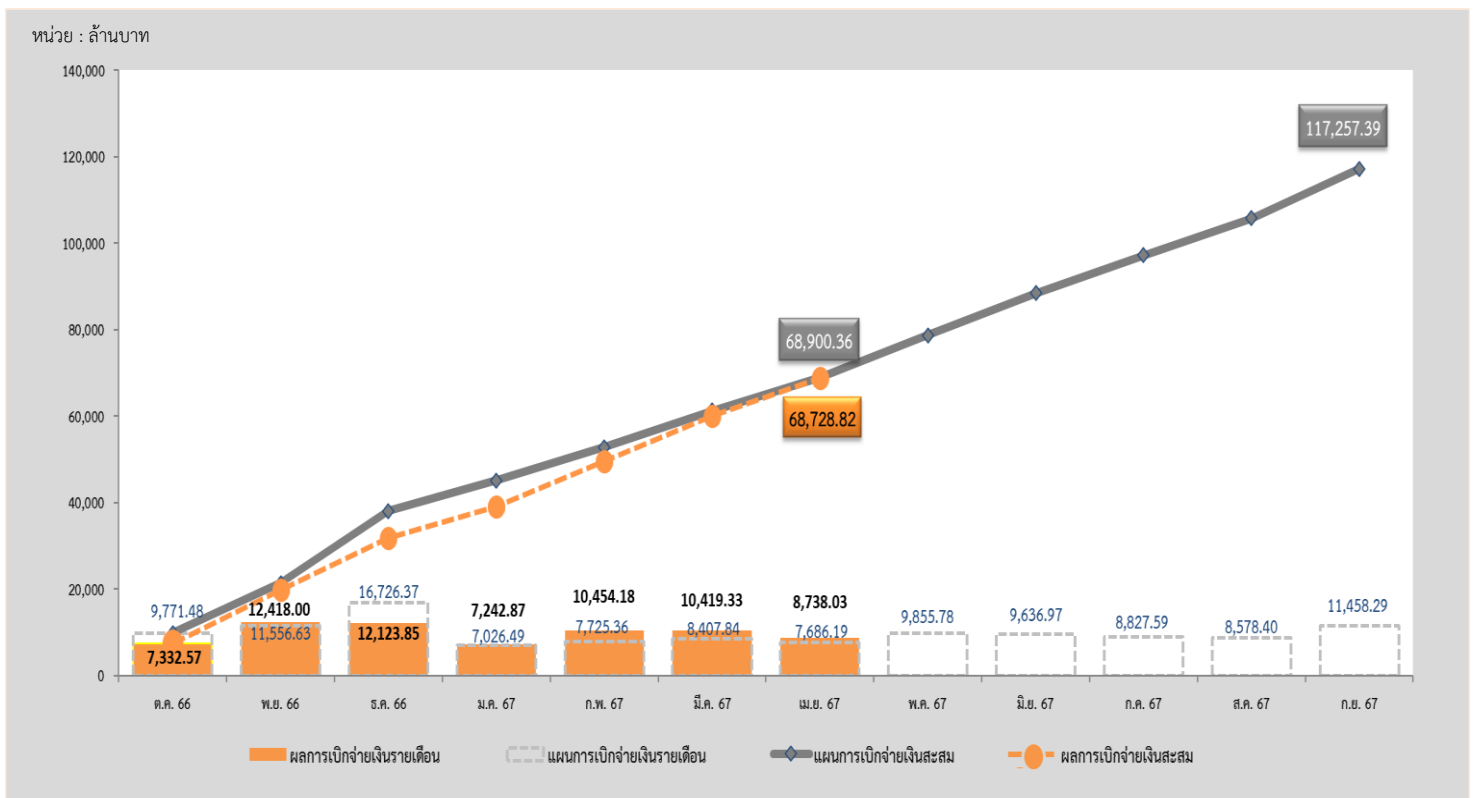

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งเงิน


ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 68,728.82 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้สะสม จำนวน 32,899.80 ล้านบาท (ร้อยละ 47.87) เงินรายได้สะสม จำนวน 25,213.62 ล้านบาท (ร้อยละ 36.69) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 10,615.40 ล้านบาท (ร้อยละ 15.44) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงินพบว่า

- **เงินกู้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 32,899.80 ล้านบาท (ร้อยละ 37.20 ของแผน)

- **เงินรายได้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 25,213.62 ล้านบาท (ร้อยละ 124.06 ของแผน)


- **เงินงบประมาณ** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 10,615.40 ล้านบาท (ร้อยละ 125.01 ของแผน)

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

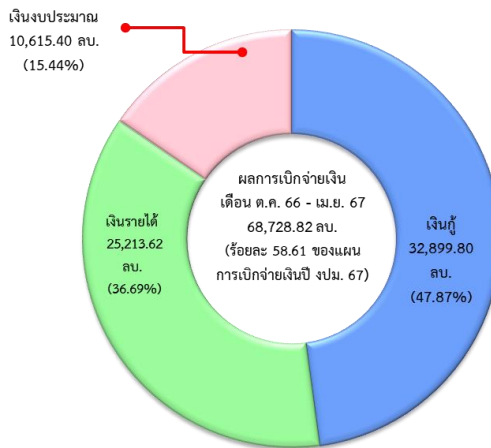

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

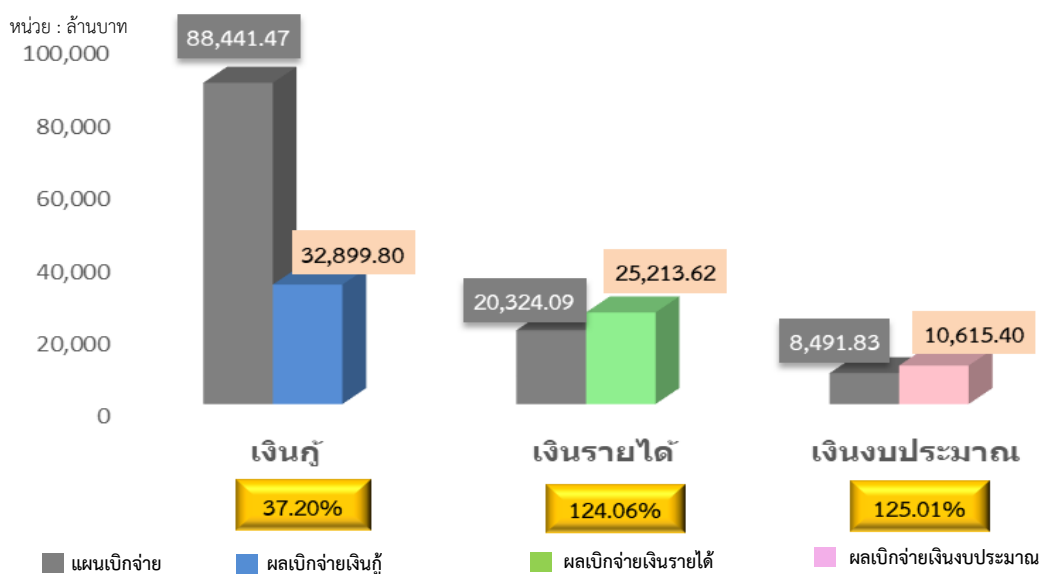

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามสาขาการลงทุน

เมื่อพิจารณาแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามสาขาการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพบว่า สาขาการลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. สาขาคมนาคมขนส่ง แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

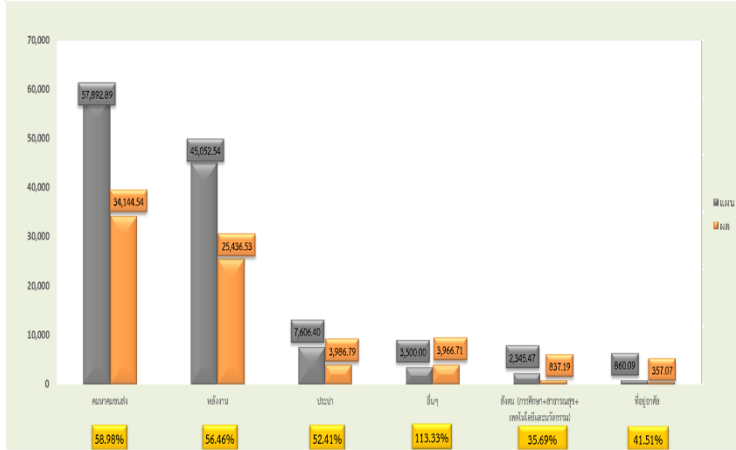

มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 57,892.89 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 34,144.54 ล้านบาท (ร้อยละ 58.98 ของแผน) 2. สาขาพลังงาน มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 45,052.54 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 25,436.53 ล้านบาท (ร้อยละ 56.46 ของแผน) และ 3. สาขาประปา มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 7,606.40 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 3,986.79 ล้านบาท (ร้อยละ 52.41 ของแผน)


ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

แผนภาพที่ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

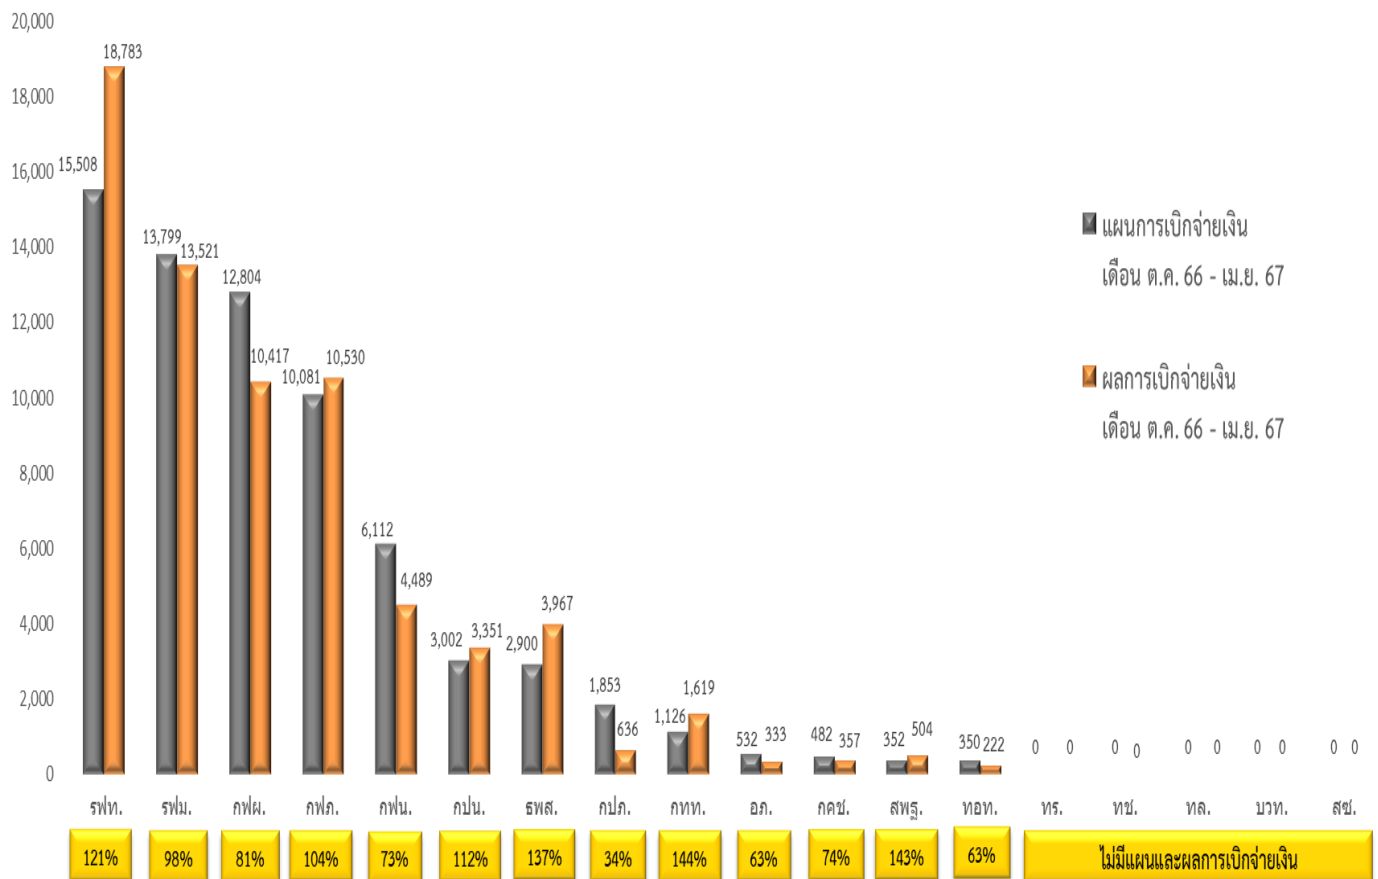

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้ **สูงกว่า** แผนการเบิกจ่าย และ 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน **ต่ำกว่า** แผนการเบิกจ่าย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 439.00 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 1,619.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 144 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กทท. เร่งรัดงานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล และงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างคาดว่าจะในเดือนพฤศจิกายน 2567 จะนำเข้าเรือขุดลำที่ 3 ซึ่งจะครบทั้งหมด 3 ลำ ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และจะใช้ถมทะเลร่วมกับเรือขุดที่นำเข้ามาแล้วในพื้นที่ท่าเรือ E1 E2 และ F2 ภายหลังจากงานถมทะเลพื้นที่ท่าเรือ F1 แล้วเสร็จต่อไป

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 152.70 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 504.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 143 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค สพฐ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการงบอุดหนุนการศึกษาของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง และเร่งรัดการก่อสร้างสถาบันไทย - Kosen แห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีความก้าวหน้าร้อยละ 60.85 เร็วกว่าแผนร้อยละ 3.56 โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2567

3) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 1,066.71 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 3,966.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 137 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โชนซี ธพส. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ และงานพัฒนาระบบโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน โดย ธพส. คาดว่าจะทยอยส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 และจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2568

4) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 3,274.36 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 18,782.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ของ รฟท. เร่งรัดการเวนคืนที่ดิน และส่งมอบพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่แปลงต่อเนื่องให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติม ส่งผลให้ผู้รับจ้างสามารถก่อสร้างทางรถไฟและสถานีรถไฟได้มากกว่าแผน

5) การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 349.18 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 3,350.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 112 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 กปน. เร่งรัดการขุดเจาะและก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม และช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมด

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่าย **สูงกว่า** แผน 449.21 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 10,530.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ กฟภ. เร่งรัดการติดตั้งอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) วิทยุสื่อสาร และ Hardware/Software

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567

7) การเคหะแห่งชาติ (กคช.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 124.59 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 357.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 การก่อสร้างอาคาร A1 เกิดความล่าช้า เนื่องจาก กคช. ได้ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิม เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 จึงจำเป็นต้องจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ทั้งนี้ กคช. ได้ผู้ชนะการประกวดราคาเพื่อก่อสร้างโครงการแล้ว โดยอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลประกอบการอนุมัติประกาศผู้ชนะการประกวดราคา และคาดว่าจะเสนอคณะกรรมการ กคช. พิจารณาอนุมัติ และลงนามสัญญาได้ภายในเดือนมิถุนายน 2567

8) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,623.09 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 4,489.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) แผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน รัชดาภิเษก เนื่องจาก กฟน. ได้ปรับแบบงานก่อสร้างการเจาะท่อใต้ดินลอดคลองพระราม 9 บริเวณสะพานช่วงรัชดาภิเษก - พระราม 9 ที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างสะพานและระบบต่าง ๆ ใต้ดินได้ กฟน. จึงต้องเปลี่ยนแบบการก่อสร้างเป็นแบบ Cable Touch ซึ่งเป็นการติดตั้งสายเคเบิลเกาะติดที่โครงสร้างของสะพานเหนือคลองแทนการเจาะท่อใต้ดินลอดคลองเพื่อร้อยสายเคเบิล โดย กฟน. ได้รับความเห็นชอบให้เข้าใช้พื้นที่จาก 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) รฟม. 2) สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และ 3) กรมเจ้าท่าแล้ว นอกจากนี้ สำนักการโยธา กทม. ได้อนุมัติแบบก่อสร้างแล้ว โดย กฟน. ได้นำหนังสือแจ้งอนุญาตเข้าพื้นที่เสนอต่อกรมธนารักษ์ เพื่อขอเข้าใช้พื้นที่บริเวณสะพานช่วงรัชดาภิเษก - พระราม 9 แล้ว โดยคาดว่าจะได้รับอนุญาตเข้าใช้พื้นที่ภายในเดือนมิถุนายน 2567

9) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 199.01 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 332.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสิตระยะที่สอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างติดตั้งและทดสอบงานระบบผลิตน้ำ ระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศของแต่ละอาคาร จึงยังไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องจักรเข้ากับระบบสนับสนุนต่าง ๆ ได้ รวมทั้ง อภ. มีการแก้ไขสัญญางานเครื่องจักรในกระบวนการผลิตยาให้ตรงกับสภาพการใช้งานจริงก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ทั้งนี้ อภ. ได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามการเบิกจ่ายเงินลงทุนโครงการเพื่อติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอย่างใกล้ชิด

10) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 127.78 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 221.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ทอท. เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากกิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ทอท. ยกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างรายเดิมแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินทำให้ไม่สามารถจัดหาวัสดุและแรงงานเข้ามาดำเนินการได้ โดย ทอท. อยู่ระหว่างประมาณค่าเสียหาย และราคาค่าก่อสร้างใหม่สำหรับส่วนงานที่เหลือจากผู้รับจ้างรายเดิม เพื่อคำนวณงบประมาณสำหรับจัดจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ 2) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนและระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง ตามแผนคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ในเดือนพฤษภาคม 2567 และ 3) งานจ้างก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้ในเดือนพฤษภาคม 2567

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนเมษายน 2567

11) การประสานส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่ายต่ำกว่าแผน 1,217.32 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 635.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อ.เมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ งานวางท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจากฝ่ายกฎหมาย ของ กปภ. อยู่ระหว่างพิจารณาแก้ไขสัญญาแบบงานท่อตูดของเครื่องสูบน้ำแรงสูงบริเวณสถานีผลิตน้ำวิทยาลัยเกษตรที่ปรับใหม่ โดยคาดว่าจะแก้ไขสัญญาแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2567 และดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567
