

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567


จัดทำโดยสำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ติดตามการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐที่เป็นโครงการเงินกู้ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ (Ongoing Projects) ในสาขาการลงทุนต่างๆ เช่น สาขาคมนาคมขนส่ง สาขาพลังงาน สาขาประปา และสาขาที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 95 โครงการ ครอบคลุมวงเงินรวมตามมติ ครม. จำนวน 2,034,115.15 ล้านบาท โดย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงินสะสมจำนวน 1,064,795.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกรอบวงเงินตามมติ ครม.

แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการลงทุนภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 117,257.39 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 จำนวน 110,384.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.14 ของแผนการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือคิดเป็นร้อยละ 104.33 ของแผนการเบิกจ่ายเงินสะสม 11 เดือน (105,799.10 ล้านบาท)

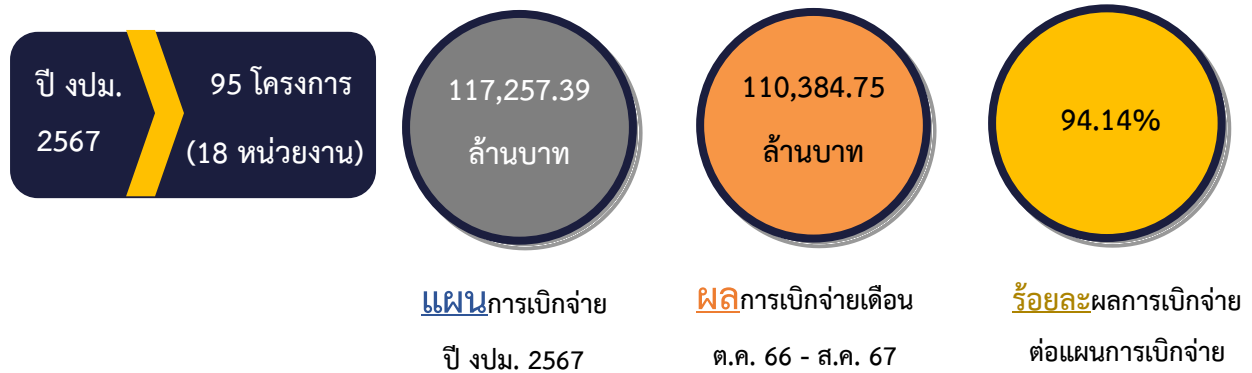

แผนภาพที่ 1: แผนการเบิกจ่ายเงิน-ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกรายเดือน

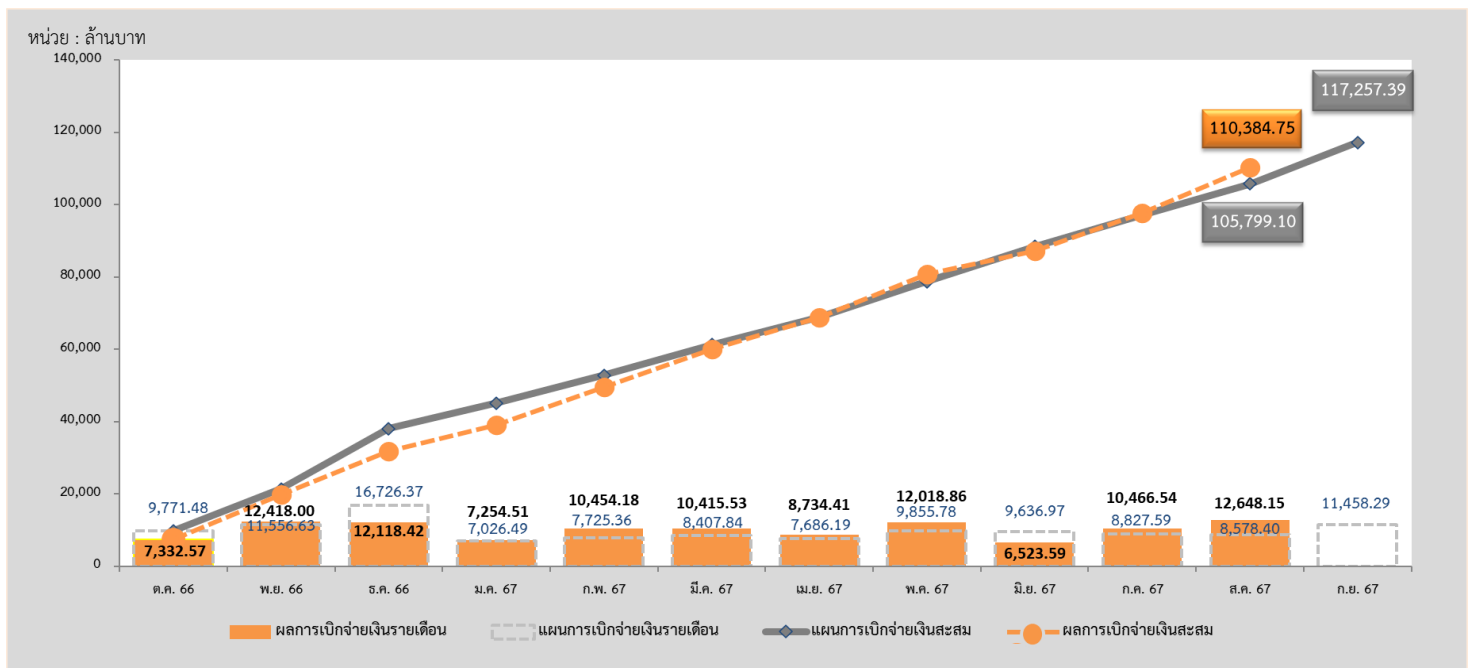

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามแหล่งเงิน


ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 110,384.75 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินกู้สะสม จำนวน 65,254.17 ล้านบาท (ร้อยละ 59.12) เงินรายได้สะสม จำนวน 31,279.03 ล้านบาท (ร้อยละ 28.33) และเงินงบประมาณสะสม จำนวน 13,851.55 ล้านบาท (ร้อยละ 12.55) โดยเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามแหล่งเงินพบว่า

- **เงินกู้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 88,441.47 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 65,254.17 ล้านบาท (ร้อยละ 73.78 ของแผน)

- **เงินรายได้** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 20,324.09 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 31,279.03 ล้านบาท (ร้อยละ 153.90 ของแผน)


- **เงินงบประมาณ** มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 8,491.83 ล้านบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13,851.55 ล้านบาท (ร้อยละ 163.12 ของแผน)

แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

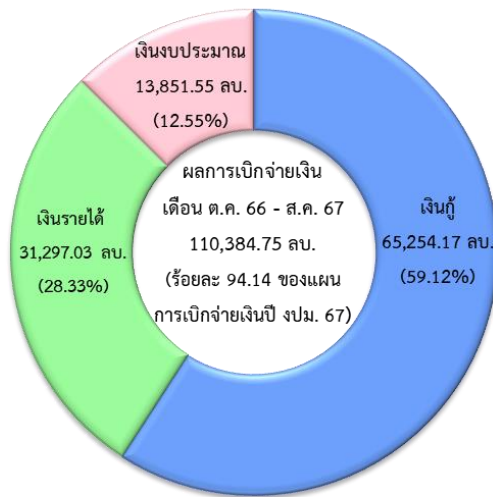

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

แผนภาพที่ 3 การเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามแหล่งเงิน

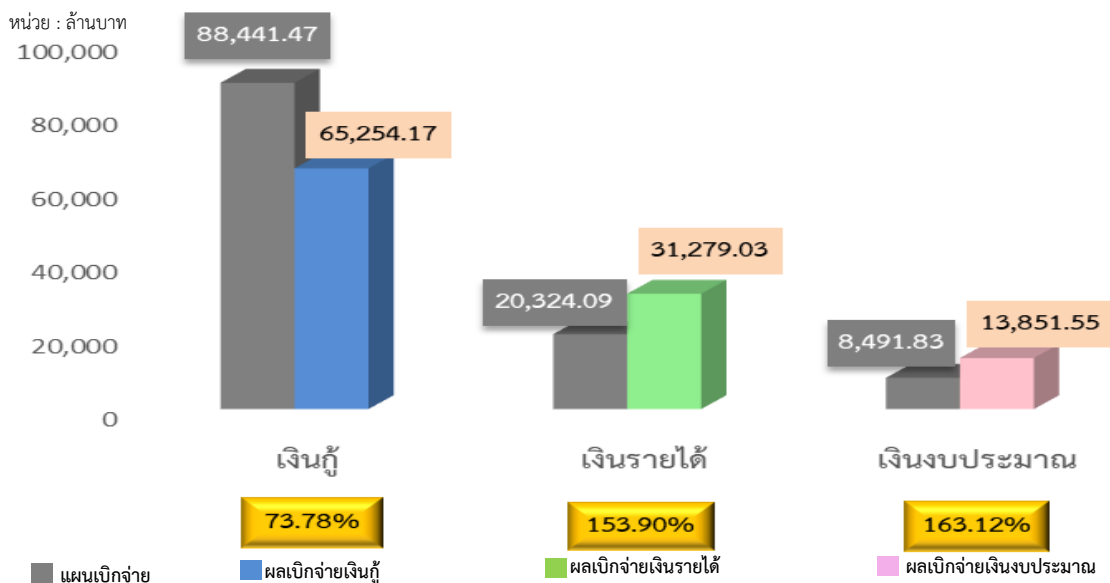

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report


การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามสาขาการลงทุน

เมื่อพิจารณาแผนและผลการเบิกจ่ายเงินจำแนกตามสาขาการลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะพบว่า สาขาการลงทุนที่มีแผนการเบิกจ่ายเงินมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. สาขาคมนาคมขนส่ง แผนภาพที่ 4 เปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามสาขาการลงทุน

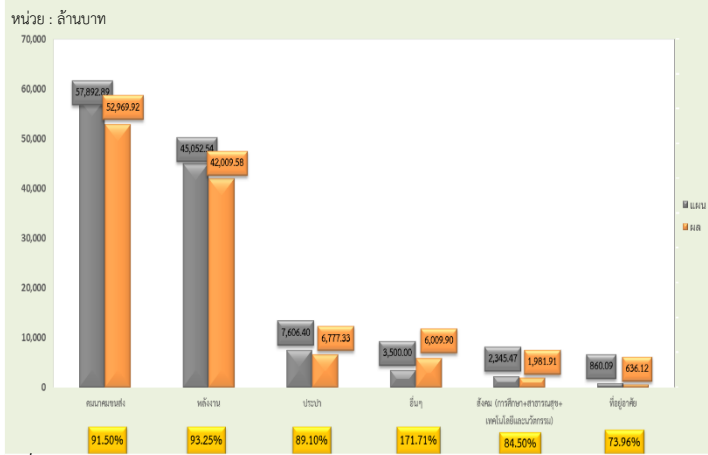

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.


มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 57,892.89 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 52,969.92 ล้านบาท (ร้อยละ 91.50 ของแผน) 2. สาขาพลังงาน มีแผนการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 45,052.54 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 42,009.58 ล้านบาท (ร้อยละ 93.25 ของแผน) และ 3. สาขาประปา มีแผนการเบิกจ่ายเงินจำนวน 7,606.40 ล้านบาท เบิกจ่ายได้ จำนวน 6,777.33 ล้านบาท (ร้อยละ 89.10 ของแผน)

แผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำแนกตามหน่วยงาน

แผนภาพที่ 5 แผนและผลการเบิกจ่ายเงิน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

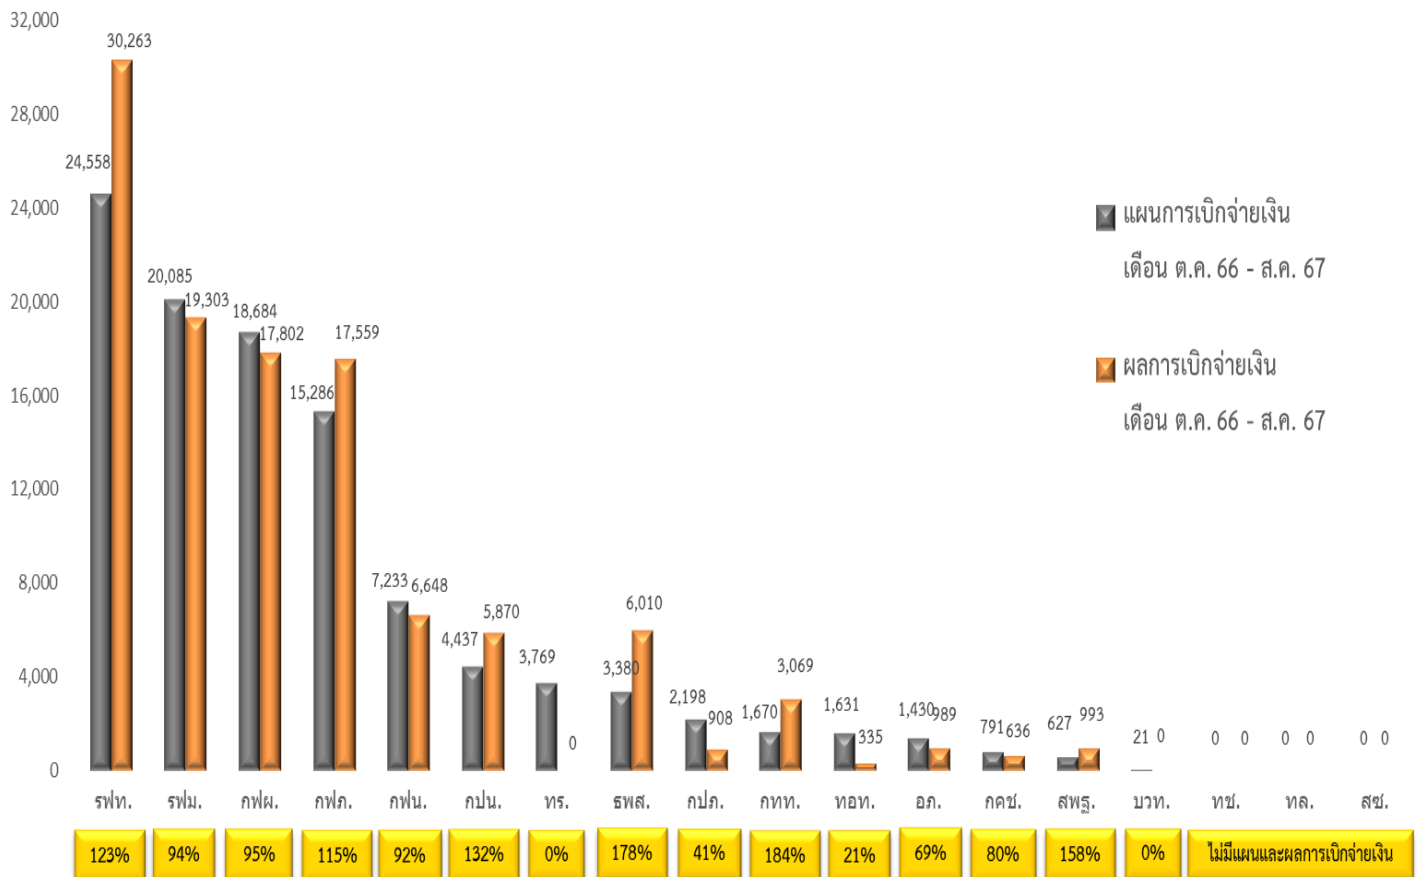

ที่มา : ระบบ PDMO Portal สบน.

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567

จากการเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567 รายหน่วยงาน สามารถแบ่งกลุ่มหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างมีนัยสำคัญได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้**สูงกว่า**แผนการเบิกจ่าย 2) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงิน**ต่ำกว่า**แผนการเบิกจ่ายเงิน และ 3) หน่วยงานที่**ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 1,399.02 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 3,069.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 184 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 กทท. เร่งรัดงานก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเล และงานถมทะเลในพื้นที่ท่าเรือ F1 โดยผู้รับจ้างได้จัดหาเครื่องจักรหิน และเรือบรรทุกหินสำหรับก่อสร้างคันหินล้อมพื้นที่ถมทะเลเพิ่มเติมแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2567 ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน นอกจากนี้ ผู้รับจ้างคาดว่าจะในเดือนพฤศจิกายน 2567 จะนำเข้าเรือขุดลำที่ 3 ซึ่งจะครบทั้งหมด 3 ลำ ตามจำนวนที่ระบุในสัญญา และจะใช้ถมทะเลร่วมกับเรือขุดที่นำเข้ามาแล้วในพื้นที่ท่าเรือ E1 E2 และ F2 ภายหลังจากงานถมทะเลพื้นที่ท่าเรือ F1 แล้วเสร็จต่อไป

2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 2,629.90 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 6,009.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 178 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนต่อขยายศูนย์ราชการฯ โซนซี ธพส. เร่งรัดการก่อสร้างอาคารด้านทิศเหนือ อาคารด้านทิศใต้ และจัดซื้อครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารเพื่อส่งมอบพื้นที่ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับอนุมัติให้เข้าใช้พื้นที่ได้ตามแผน ทำให้เบิกจ่ายเงินได้สูงกว่าแผน ทั้งนี้ ธพส. จะทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงานตามแผนต่อไป โดยคาดว่าจะก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2568

3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 365.93 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 992.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 158 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค สพฐ. เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายการงบบุคลากรของนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง และเร่งรัดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถาบันไทย - Kosen ทั้ง 2 แห่ง

4) การประปานครหลวง (กปน.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 1,432.17 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 5,869.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 กปน. เร่งรัดการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำช่วงคลองมหาสวัสดิ์ถึงถนนเพชรเกษม และช่วงถนนกัลปพฤกษ์ถึงสถานีสูบน้ำบางมด

5) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 5,704.44 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 30,262.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 123 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงใหม่-เชียงใหม่ของ รฟท. เร่งรัดการเวนคืนที่ดินและส่งมอบพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แปลงใหญ่และพื้นที่แปลงต่อเนื่องให้ผู้รับจ้างเพิ่มเติม ส่งผลให้ผู้รับจ้างสามารถก่อสร้างทางรถไฟและสถานีรถไฟได้เร็วกว่าแผน

Executive Summary Report

การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2567

6) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เบิกจ่าย**สูงกว่า**แผน 2,273.16 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 17,559.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 115 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 1 (คพจ.1) กฟภ. เร่งรัดการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าและสายจำหน่ายแรงสูงในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

7) องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เบิกจ่าย**ต่ำกว่า**แผน 440.71 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 989.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยารังสีระยะที่สอง อ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี อภ. ได้ทดสอบเครื่องจักรในการผลิตยาเม็ดและยาน้ำที่โรงงานผู้ผลิต พบว่า มีเครื่องบรรจุยาที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งผู้ผลิตต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบให้ อภ. โดยผู้ผลิตคาดว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จและส่งมอบเครื่องจักรได้ในเดือนกันยายน 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานจะประชุมเพื่อเร่งรัดงานทุกสัปดาห์

8) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เบิกจ่าย**ต่ำกว่า**แผน 1,290.21 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 907.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ - (อุทุมพรพิสัย) - (ทุ่งไชย) - (ห้วยทับทัน) อ.เมืองศรีสะเกษ - อุทุมพรพิสัย - ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ งานวางท่อเกิดความล่าช้า เนื่องจากรูปแบบงานวางท่อเดิมไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง โดย กปภ. อยู่ระหว่างปรับแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้างงานวางท่อของโรงสูบน้ำแรงสูงบริเวณหน่วยบริการอุทุมพรพิสัยใหม่ ซึ่งหากวงเงินไม่เกินกรอบวงเงินสัญญาจ้างเดิม กปภ. จะพิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2568

9) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เบิกจ่าย**ต่ำกว่า**แผน 1,295.81 ล้านบาท (เบิกจ่ายได้ 334.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของแผนการเบิกจ่ายเงิน) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ทอท. เบิกจ่ายเงินได้ต่ำกว่าแผน เนื่องจากกิจกรรม 2 กิจกรรม ดังนี้ 1) งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ทอท. อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายโครงการ และคำนวณราคาค่าก่อสร้างสำหรับส่วนงานที่เหลือของผู้รับจ้างรายเดิม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2567 หลังจากนั้น ทอท. จะเริ่มกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ โดยคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างรายใหม่และลงนามสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2568 2) งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบสายพานลำเลียงกระเป๋า (BHS) และระบบตรวจจับวัตถุระเบิด (EDS) (ขาเข้า) ทอท. อยู่ระหว่างทบทวนรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานในปัจจุบัน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินงานบางส่วนเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน ทำให้การเข้าพื้นที่มีขั้นตอนและระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการติดตั้งระบบสายพานลำเลียงบางส่วนไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากความสูงของโครงสร้างอาคารบางจุดไม่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบสายพานลำเลียง

10) กองทัพอากาศ (ทร.) **ไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน** โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก (ในส่วนที่รัฐรับภาระการลงทุน) ทร. ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจาก 1) ทร. อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเจรจาเงินกู้ 2) งานจ้างปรึกษาคงควบคุมงานก่อสร้าง ทร. อยู่ระหว่างพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ และ 3) งานจ้างก่อสร้าง ทร. พิจารณาคุณสมบัติ เทคนิค และราคาของผู้ยื่นข้อเสนอแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างกระบวนการประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ คณะผู้แทนฝ่ายไทยเพื่อร่วมเจรจาเงินกู้สำหรับโครงการฯ ได้เจรจาสัญญาเงินกู้และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (AIIB) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2567 โดยคาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างและเริ่มเบิกจ่ายเงินกู้ได้ในเดือนธันวาคม 2567
